1	Изрязване на асфалтова настилка	1 990,00	10	67	85	19	Футорезачка - 16р.
2	Разваляне на асфалтова настилка	1 195,20	5	76	85	11	багер -16р
3	Натоварване и изхвърляне на асфалтов отпадък на депо до 15км	133,52	-	67	85	19	Автосамосвал - 16р.; Багер - 16р.
4	Изкоп в земни почви машинно	1 975,40	-	83	86	4	Багер - 16р.
5	Изкоп в земни почви ръчно	499,85	10	83	96	14	лопати-10 бр.
6	Прехвърляне на изкопаната маса на 2,00 м вертикално и хоризонтално	499,85	3	83	96	14	ръчни колички - 30р.
7	Натоварване излишната земна маса с багер на самосвал	308,92	-	83	96	14	багер -16р.
8	Превоз на излишни земни маси на депо до 5км	308,92	-	83	96	14	Автосамосвал - 16р.
9	Разриване с бордьонер на земни маси	308,92	-	94	96	3	Бордьонер - 16р.
10	Пренос с ръчни количи на пясък на 50м	332,00	4	97	100	4	ръчни колички - 20р.;лопати - 20р.
11	Подложка от пясък	332,00	7	97	103	7	Вибро трамбовка - 3 бр.
12	Обратен насип земни почви ръчно	620,20	12	103	110	8	Вибро трамбовка - 6 бр.
13	Обратен насип земни почви машинно	987,70	-	103	110	8	Багер - 1 бр. Пневмати пневматични валяци - 1бр.
14	Доставка и полагане на трошена фракция	399,42	6	107	111	5	валяк статичен самоходен - 1бр.;трейдер самоходен - 1бр.
15	Доставка и полагане на асфалтова настилка	1 205,16	11	108	117	10	Асфалтополагач - 1бр.; Валяк самоходен пневматичен - 1бр.; Валяк бандажен - 2бр.
Б	**Монтажни работи**						
1	Доставка и монтаж на тръба DN90 PEHD PE100RC, PN10 е включени 1% крайпътие	830,00					
2	Доставка и монтаж на СЖ DN 80, комплект с скривателна гарнитура	5,00					
3	ПХ ф80	4,00					
4	Доставка и монтаж на универсален фланшов адаптер за етернит DN 80	4,00	10	100	109	8	Апарат за заваряване - 7 бр.
5	Берт ф90	23,00					
6	Доставка и монтаж на Тр.ф3 90/90	9,00					
7	Направа водопроводно отклонение90/63 до 5м	6,00					
8	Направа водопроводно отклонение90/90 до 5м	1,00					
9	Направа водопроводно отклонение90/25 до 5м	53,00					
II	**ЧАСТ: ПЪТНА**						
II.1	**Директно трасе**						
1	Фрезоване на съществуващи асфалтова настилка	1 056,00	2	108	112	5	Пътни фреза - 16р
2	Изнасяне на съществуващи асфалтови светлини за предварителен ремонт	2 891,00	5	109	113	5	Асфалтополагач - 16р.; Валяк пневматичен самоходен - 16р.; Валяк бандажен - 20р.
3	Доставка и монтаж на пилон отводнител, вкл. зацементиран в канал	46,00	2	113	113	1	Товарен автомобил - 16р.
4	Поддържане на съществуващи ДШ	3,00	2	112	113	2	-
5	Поддържане на съществуващи РШ	28,00	4	112	115	4	-
6	Доставка и полагане на втори битумен разлив	19 300,00	4	113	118	6	автогудронатор - 40р.
7	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон с деб. 5 см	19 300,00	15	114	123	10	Асфалтополагач - 16р.; Валяк пневматичен самоходен - 16р.; Валяк бандажен - 20р.
8	Доставка и полагане на асфалтобетон за изравняване	940,00	6	113	117	3	Асфалтополагач - 16р.; Валяк пневматичен самоходен - 16р.; Валяк бандажен - 20р.
II.2	**ЖРЪСТОПИЩЕ при ул."Гонфлер" и ул. "Цар Симеон"**						
1	**РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ**						
1.1	Изкоп за реконструкция (механизирано,), включителен натоварване и транспорт на депо	45,36	-	122	122	1	Багер - 15р
1.2	Изкоп за реконструкция (ръчно), включителен натоварване и транспорт на депо	18,44	10	123	128	6	лопати - 10 бр.
1.3	Натоварване и транспорт на излишни земни маси	226,80	-	122	127	6	автосамосвал - 16р.
1.4	Разглобяване на съществуващи бетонови бордюри и превоз на депо	215,00	-	127	128	2	Багер - 16р.; автосамосвал - 16р.
1.5	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо	324,50		128	129	2	Багер - 16р.
1.6	Разваляне на бетонова тротоарна настилка и превоз на депо	22,00					
1.7	Рязане на бетонова тротоарна настилка	2,00	1	129	129	1	футорезачка - 16р.
2	**АСФАЛТОВИ РАБОТИ**						
2.1	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС2014	695,00	4	139	141	3	автогудронатор - 40р.
2.2	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон тип "А", полимермодифициран битум Пм Б-5/80-65, с дебелина в уплътнено състояние 5 см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума с цел осигуряване над 80 % обвита с битум повърхност на фракциите	346,50	5	141	142	2	Асфалтополагач - 16р.; Валяк пневматичен самоходен - 16р.; Валяк бандажен - 20р.
2.3	Направа на реконструкция и всички свързани с това разходи , вкл. доставка, полагане и уплътняване на трошен камък с дебелина 32 см. , битумизиран трошен камък с деб.6 см. и пеещия афалтобетон с деб. 6 см.	346,50	6	136	140	5	валяк статичен самоходен - 1бр.;трейдер самоходен - 1бр.
3	**ПЪТНИ РАБОТИ**						
3.1	Доставка и полагане на сини бетонови бордюри с размер 18/35/50	207,00	4	129,00	135	7	Бордюрна кола - 16р.
3.2	Доставка и полагане на бетон С12/15 за бордюри 18/35/50	17,43					Бетонобот - помпа - 16р.
3.3	Възстановяване на бетонова тротоарна настилка покрай бордюри	16,90					Бордюрна кола - 16р.
3.4	Възстановяване на тротоар от бетонови плочи, включително уплътняване и профилиране на земната основа, трошен камък 40 см и пясъчна излагаемица 4 см.	77,80	5	143	144	2	ръчна трамбовка - 30р.
4	**ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО**						
4.1	Доставка и полагане на хоризонтални маркировки бяла боя без пиперли, включително всички свързани с това разходи	200,00	3	145,00	147	3	машини за нанасяне на пътна маркировка - 16р.
4.2	Доставка и полагане на напречна хоризонтална маркировка бяла боя без перли, включително всички свързани с това разходи	28,00					
4.3	Демонтаж на стандартни пътни знаци, включителен всички свързани с това разходи	5,00	2	108	108	1	-
4.4	Демонтаж на нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	10,00					
4.5	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	5,00	3	148	141	1	Бордюрна кола - 16р.
4.6	Доставка и монтаж на нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи	10,00					
4.7	Доставка и уреждане на конзола за нестандартни пътни знаци	4,00					
4.8	Комплект знаци за ВОБД	1,00	2	1	107	3	-
5	**РЕМОНТНИ РАБОТИ**						
5.1	Почистване и изливане на шахти	2,00	3	140	140	1	-
	Етап на предаване на обекта на Възложителя						
	Демобилизация и цялостно почистване на строителната площадка		3	149	150	2	автокран - 1 бр, багер - 1 бр.
	Подготовка и подписване на констативен акт обр.15			149	150	2	-

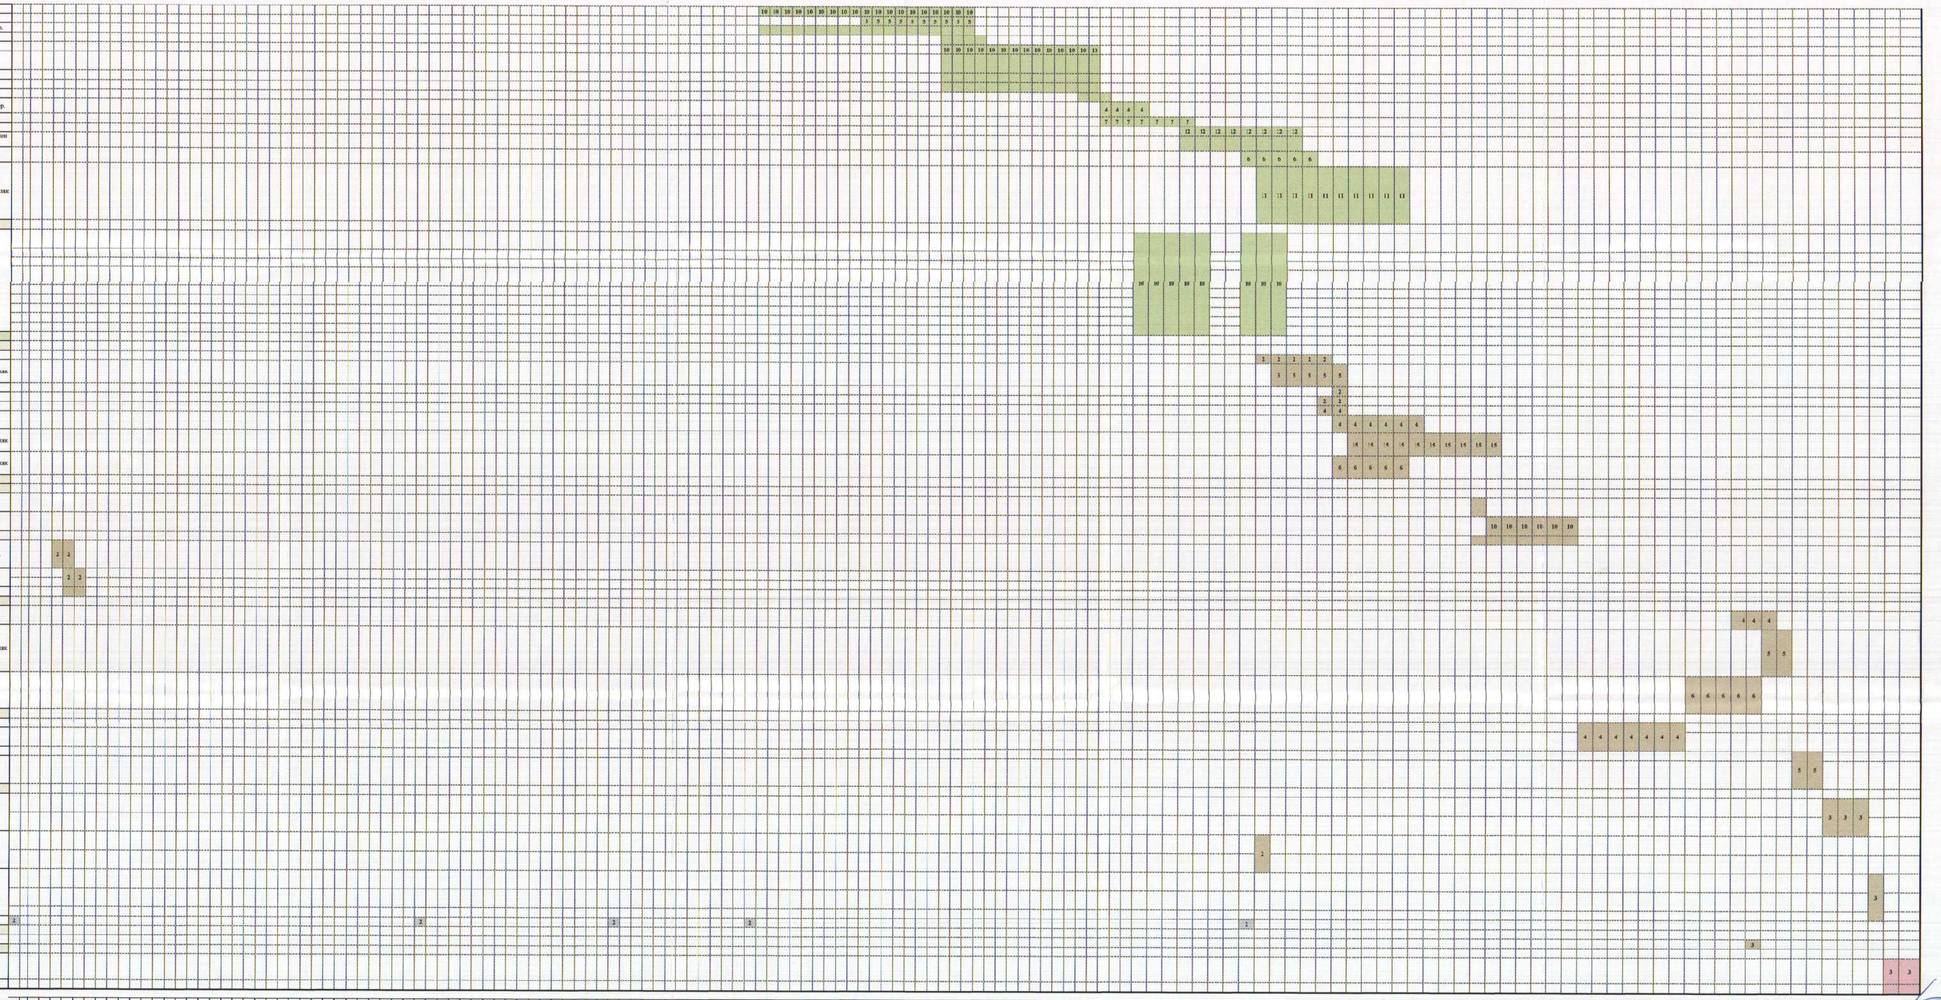

Забележка: В снео са маркирани дните, от седмиците , които се падат Събота и Неделя. Те са отбелязани при условие, че -ния ден на изпълнение на договора, съвпада е началото на работната седмица - тоест Понеделник. Имаме готовност Линейният график да бъде актуализиран зрели стартиране на дейностите по изпълнение на Договор, яко това е наложено от промяна на изходните параметри.

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД
