Приложение 1: **Линеен график**

„Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект „Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич".

ID	Наименование на дейностите	Ед.мярка	Количество	Продължителност
1	**Срок за изпълнение на обществената поръчка**			**310 days**
2	**Етап 1 - Проектиране - изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за обекта**			**40 days**
3	Предпроектни проучвания. Обследване на съществуващото състояние на обекта, включително геодезическо заснемане	бр.	1	3 days
4	част „Технологична"	бр.	1	25 days
5	част „ВиК и Управление на водите"	бр.	1	21 days
6	част „Техническа рекултивация"	бр.	1	18 days
7	част „Биологична рекултивация"	бр.	1	16 days
8	част "Геодезическа"	бр.	1	14 days
9	част „Пожарна безопасност"	бр.	1	13 days
10	част „План за управление на строителните отпадъци"	бр.	1	14 days
11	част „План за безопасност и здраве"	бр.	1	12 days
12	част „Контрол и мониторинг"	бр.	1	14 days
13	част „Сметна документация"	бр.	1	5 days
14	част „Мониторинг"	бр.	1	12 days
15	Съгласуване на проектите, доклад за съответствие и получаването на разрешително за строеж.			

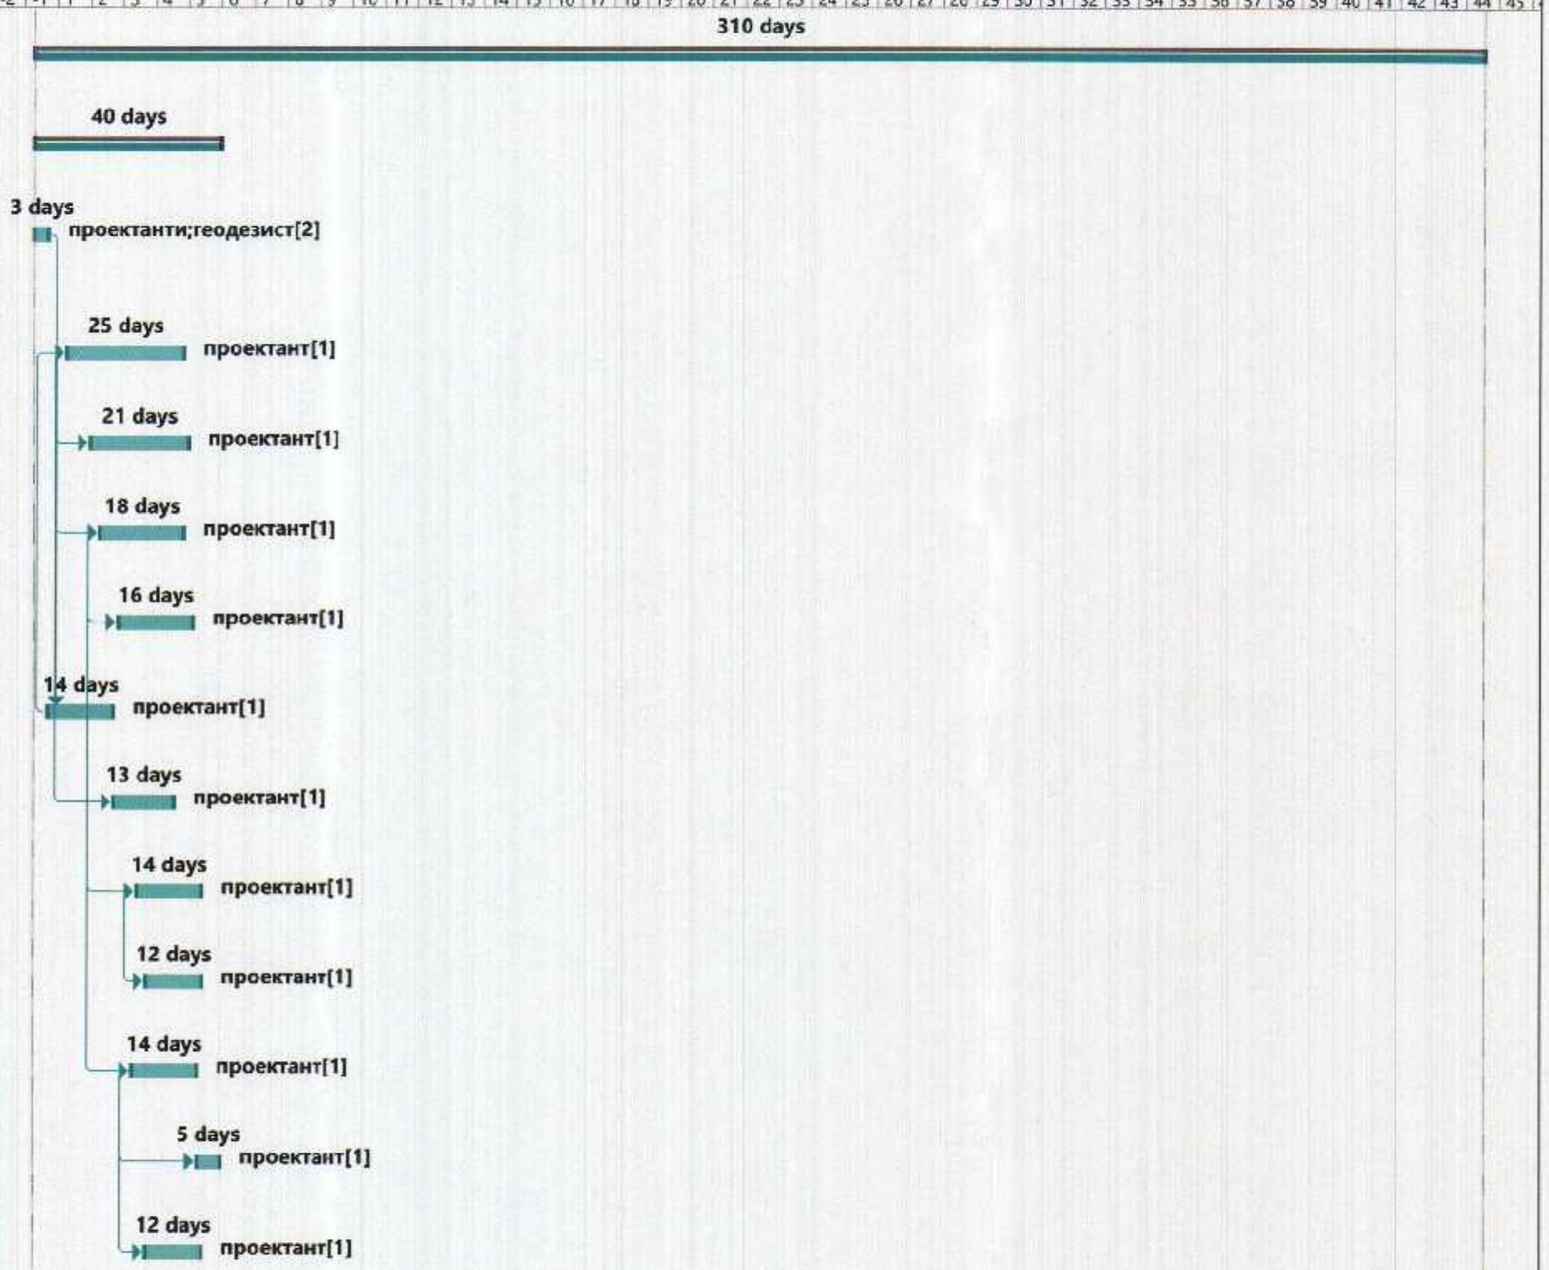

Участник: ОБЕДИНЕНИЕ "ТУМБИТЕ 2020"

Управител на Водещ партньор и представляващ Обединението : инж. Екатерина Заечка

00015

Информацията е заличена на осн. чл.37а от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена на осн. чл.37а от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД
