**Приложение 1:** **Линеен график**

„Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект „Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич".

| ID | Наименование на дейностите | Ед.мярка | Количество | Продължителност |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **Етап 2 - Извършване на СМР** | | | **270 days** |
| 17 | Подготвителни работи | бр. | 1 | 3 days |
| 18 | Почистване на строителната площадка | бр. | 1 | 7 days |
| 19 | **Земни работи** | | | **74 days** |
| 20 | Изкоп на земни маси | бр. | 1 | 18 days |
| 21 | Насип на земни маси | бр. | 1 | 20 days |
| 22 | Полагане на изолационен геоглинен екран | бр. | 1 | 27 days |
| 23 | Полагане на дренажен геокомпозит | бр. | 1 | 25 days |
| 24 | **Вертикалната планировка** | | | **68 days** |
| 25 | Преоткосиране и предепониране на слоя отпадъци за оформяне на тялото на депото, и почистване на околните замърсени терени | бр. | 1 | 65 days |
| 26 | Уплътняване на отпадъците | бр. | 1 | 67 days |
| 27 | **Техническа рекултивация** | | | **216 days** |
| 28 | Газов дренаж | бр. | 1 | 25 days |
| 29 | Запечатващ пласт | бр. | 1 | 26 days |
| 30 | Дренажна система за атмосферни води | бр. | 1 | 27 days |

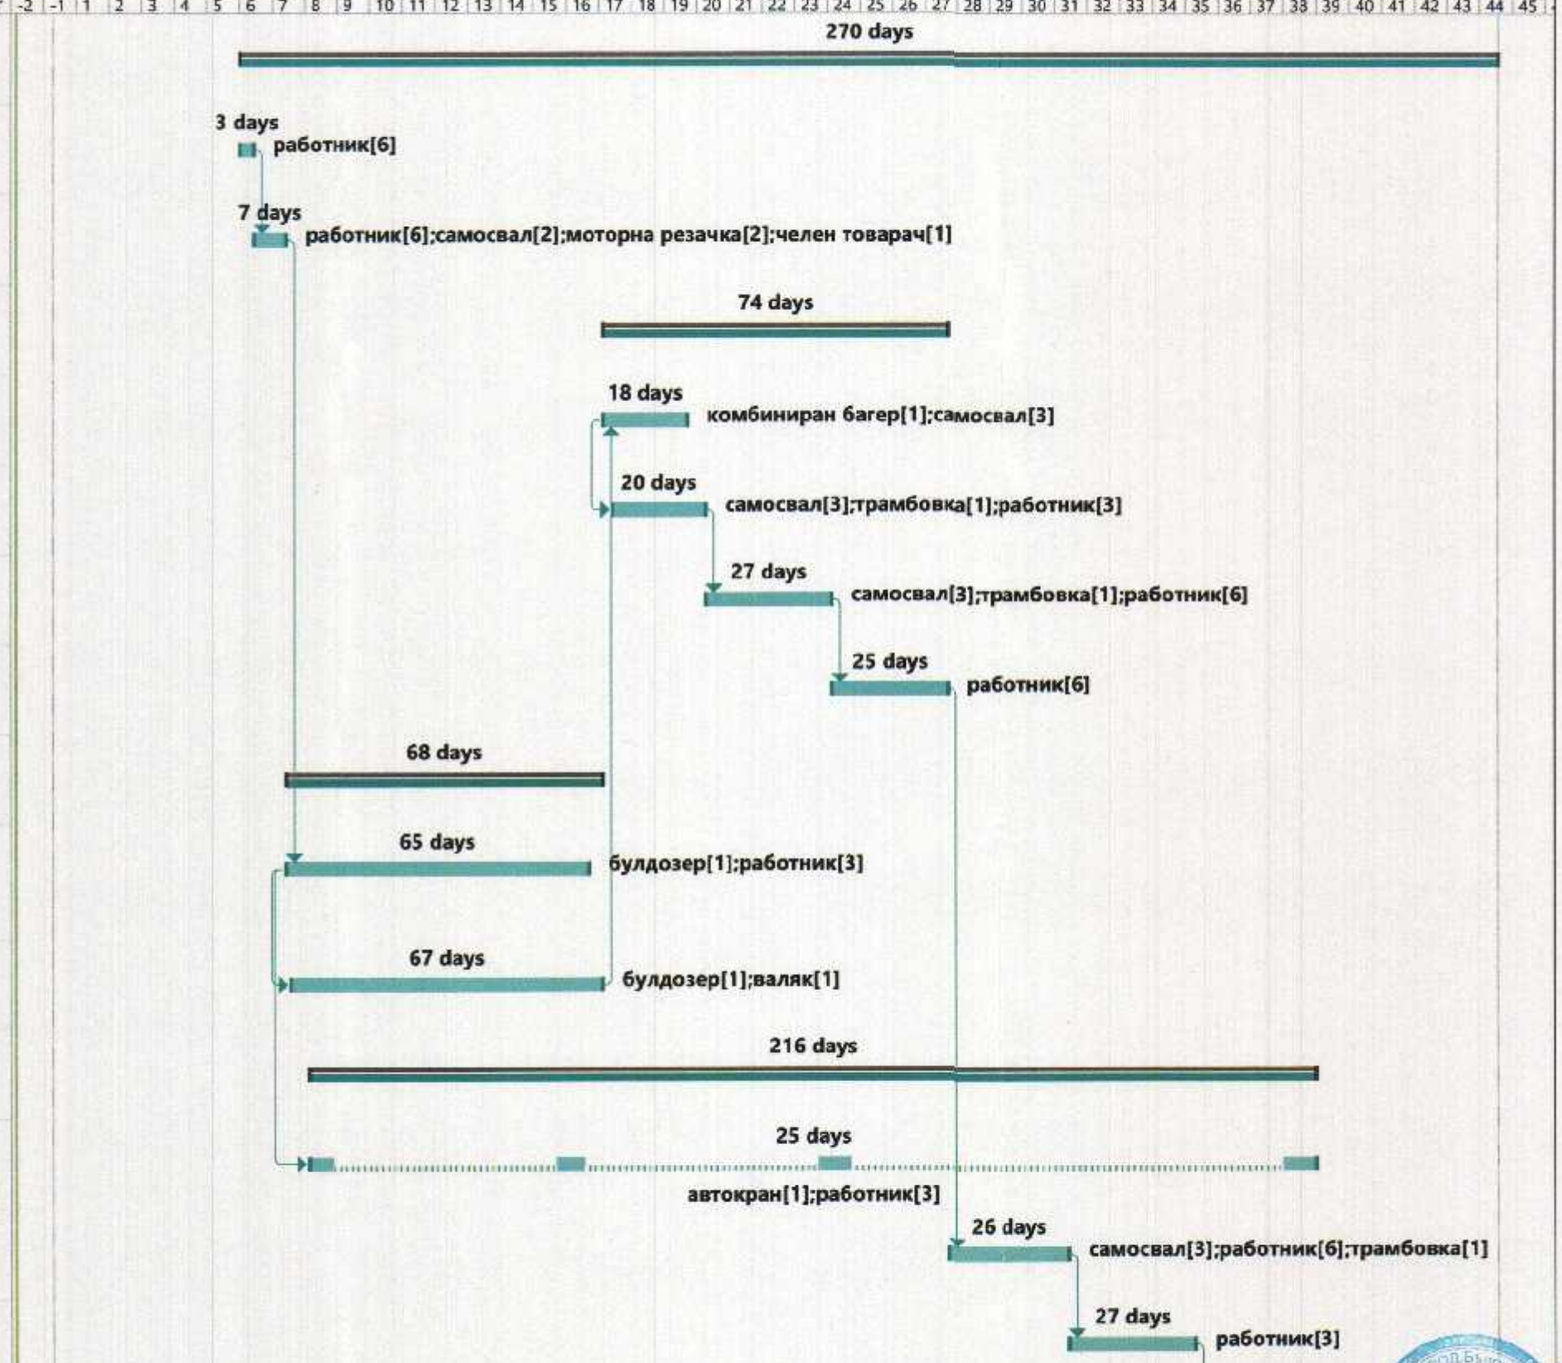


Участник: ОБЕДИНЕНИЕ "ТУМБИТЕ 2020" Управител на Водещ партньор и представляващ Обединението : инж. Екатерина Заечка по

000160

Информацията е заличена на осн. чл.37а от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена на осн. чл.37а от ЗОП във връзка с чл.59 от ЗЗЛД
