Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Приложение 1:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция - гр. Петрич".

ID	Наименование на дейностите	Ед.мярка	Количество	Продължителност
1	Съгласуване на проектите, доклад за съответствие и получаването на разрешително за строеж.			
1	**Етап 2 - Извършване на СМР**			**370 days**
1	Подготвителни работи	бр.	1	3 days
1	**Част Конструкции**	**бр.**	**1**	**134 days**
2	**Земни работи**	**бр.**	**1**	**59 days**
2	**Изкопни работи**	**бр.**	**1**	**19 days**
2	Масов изкоп	бр.	1	12 days
2	Изкоп фундаменти	бр.	1	7 days
2	**Насипни работи**	**бр.**	**1**	**40 days**
2	Трамбована земна основа	бр.	1	3 days
2	Обратен насип	бр.	1	8 days
2	**Бетонови работи**	**бр.**	**1**	**112 days**
2	Подложен бетон	бр.	1	1 day
2	Бетон фундаменти, колони, греди и плочи	бр.	1	12 days
3	Полиетиленово фолио	бр.	1	1 day

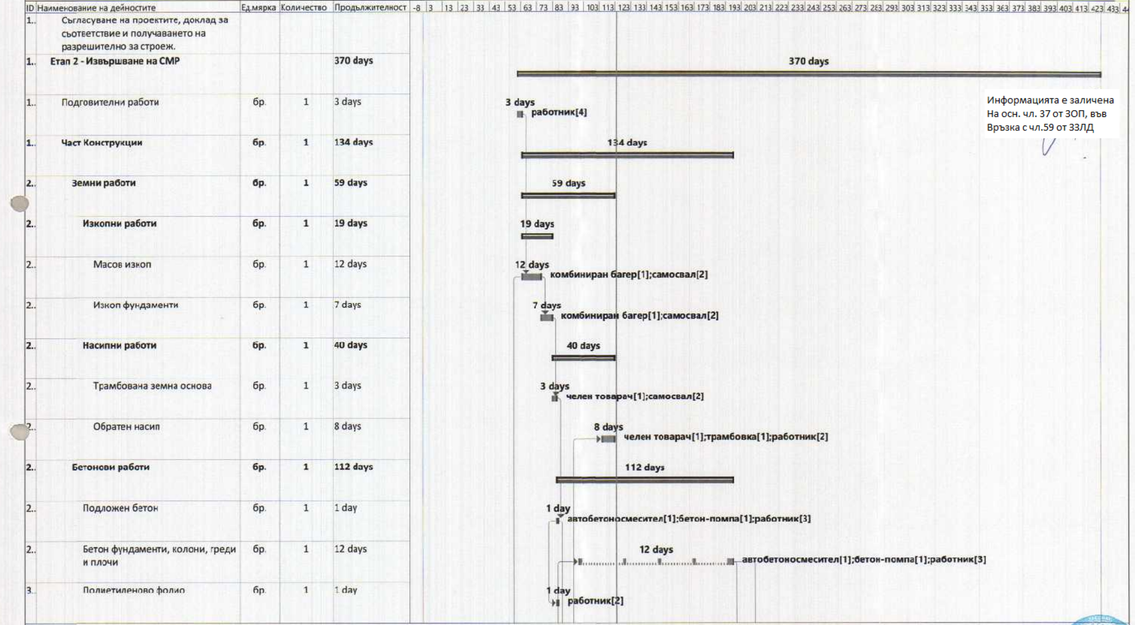

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Информацията е заличена
На осн. чл. 37 от ЗОП, във
Връзка с чл.59 от ЗЗЛД

Участник: Обединение "СП 2020"

Управител на Водещ партньор и представляващ Обединението : инж. Екатерина Заечка

подп
