

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строително-монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100; BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово“

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД

Наименование на участника

инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с посочения по-горе предмет.

Ние, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД,

(наименование на участника)

представяван от **инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ**

адрес: гр. Благоевград ул. „Тодор Александров“ № 21, телефон 0886839115, електронна поща **interkontrol@abv.bg**, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета й съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията. Прилагаме следните приложения:

1. Организация за изпълнение на поръчката:

**I. ВСТЪПИТЕЛЕН АНАЛИЗ -
ЦЕЛИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Дейностите от обхвата на настоящата поръчка се отнасят за **упражняване на строителен надзор по време на строителството, координатор безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт и окончателен доклад**, при изпълнение на проект: „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г, ДБФП: №01/07/2/0/00909 от 07.12.2017 г..

Финансовата помощ, предоставяна по тази програма, е безвъзмездна и се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност, пропорционалност и прозрачност.

Общите цели на обществената поръчка, представени в техническото задание, е инвестиране в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура с цел да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

В техническото задание Възложителят коректно и подробно е посочил видовете дейности за **извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на 4 бр. пътища на територията на Община Петрич.**

Очакваните конкретни резултати от реализацията на поръчката, ако «Интерконтрол – 2000» ЕООД е изпълнител, са:

- ❖ да представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес.
- ❖ да бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързани с надзора на строителни дейности, а също така да проверява дали строителната фирма извършва строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове).
- ❖ да осигури надежден контрол върху качеството на изпълнение на планираните строително-ремонтни дейности, съгласно предварително заложените качествени, количествени и технически параметри и показатели. Надзорните дейности са изключително важни за постигане на проектните цели и резултати.



II. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ КОНТРОЛИРА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР НА ОБЕКТА

Предвидените за изпълнение са строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на следните пътища на територията на Община Петрич:

- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634
- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84
- BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100
- BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово

Основни видове СМР, които ще включва строителството на обектите е подробно разработени в проектната документация и включва:

1. Преасфалтиране на пътищата –

Дейността включва следните строителни дейности: почистване на съществуващ пътен участък, фрезование на настилка, почистване на повърхността на пътната настилка, предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилка, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт – кръпки в настилка или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или занижаване на нивото на съществуващите ДШ и/или РШ, изграждане на нови ДШ и РШ (ако се налага), нивилетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластове стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране на плътна асфалтобетонна смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.

2. Ново асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/

Дейността включва следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, изграждане на нови или коригиране нивото на РШ и/или ДШ, проверка за достигнато необходимото ниво на настилка, за да се спазва регулата на съществуващите и новоположените бордюри, уплътняване до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча.

След геодезическа проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонна смес.

3. Предварителни ремонтни работи –

Включва покритието и полагането на два пласта асфалтобетон. Изпълнява се на конкретните места и участъци с конкретните видове работи за отстраняването на

дефектите. Преобладаващо дефектите са: единични пукнатини, мрежовидни пукнатини, коловози, слягания, дупки и др.

4. Ремонт на установените повредени участъци

Извършва се преди полагането на износващия и преди полагането на изравнителния пласт асфалтобетон. Дейността включва фрезозане на повредените участъци съгласно предвидената технология.

5. Надлъжен профил на пътя

Изпълняват се нивелетни прави и вертикални криви, съобразено с одобрения нивелетен план и съществуващото положение на настилката.

6. Оформяне на напречен профил на пътя

В зависимост от положението на нивелетата и разновидността на габаритите на пътя, се изпълняват няколко типа напречни профили и съответните детайли.

- Типов профил с дере от едната страна на пътно плътно и откос от другата;
- Типов профил с дере от едната страна на пътно плътно и съществуваща ограда или подпорна стена от другата;

7. Конструкция на настилката

В следствие от двукратното (трикратно) преасфалтиране, съществуващата настилка има необходимата носимоспособност. Предвидено е нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип "А", с дебелина 4см. и изравнителен пласт с минимална дебелина - 4см. в участъците на влошена равност. Изравнителният пласт под износващия пласт ще е от неплътен асфалтобетон.

8. Извършване на предварителен ремонт на настилката.

Преди полагането на изравнителните асфалтови пластове е предвиден предварителен ремонт на настилката, който включва следните видове работи:

- Ремонт на дупки
- Ремонт на коловози и слягала настилка.

9. Отводняване

Отводняването на настилката се осъществява по гравитачен път, като чрез надлъжния и напречен наклон, водата се оттича от платното, преминава през банкетите и попада в канавките-окопите.

Предвидено е оформяне на канавките, профилиране на облицованите окопи, изграждане на нови отводнителни при пресичането на окопите от селскостопанските пътища.

В различните обекти е предвидено изграждане на отводнителни съоръжения / тръбни водостоци с отводнителни тръби Ф1000, ф800, ф400.

Където е необходимо (при голямата денивелация и стръмен наклон на насипа, образуван при оформянето на пътната настилка) ще има съоръжение за отводняване от бетонни елементи, отводнителни улей (тип „италиански“).

Други дейности - Повдигане на дъждоприемни шахти и ревизионни шахти до повърхността на износващия пласт асфалтобетон; Полагане дренаж успоредно на пътя. с дренажната тръба ф100 и направа на обратен насип от несортиран трошен камък с дебелина от 30см.



10. Вертикална сигнализация:

Предвидените пътни знаци са I-ви типоразмер и ще се изпълняват със светлоотразително фолио.

11. Хоризонтална маркировка:

Маркировката ще се изпълнява с боя за пътната маркировка, отговаряща на изискванията, посочени във фирмената техническа спецификация.


**III. ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПЪРВОНАЧАЛНИ ДАННИ И
ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Задължение на Възложителя е да осигури необходимите документи за законно стартиране на строителството, в т.ч. съгласувани и одобрени проекти.

Съгласно чл. 143 (1) т.2 от ЗУТ Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представено **положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория и по преценка на Възложителя – за обект IV категория.**

За инфраструктурни обекти следва да има съгласуване с експлоатационни предприятия, които имат съоръжения в обсега на пътищата, подлежащи на реконструкция в настоящата обществена поръчка.

Следва да се представят съгласувателни писма от:


- „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,
 - БТК ЕАД,
 - „ВиК“ ЕООД гр. Петрич,
 - „Овергаз“ АД
 - Собственици на електронни съобщителни мрежи и др.
- 

Проектите за отделните подобекти са оценени за съответствие с изискванията на основание чл. 142, ал.6, т.1 от ЗУТ от Експертен съвет на община Петрич.

За подобектите са издадени 5 бр. Разрешения за строеж.

Обектите са III категория.

Преди започване на строителството Възложителя представя на строителния надзор следните документи:

- Становище за съответствие на проекта с ПНПБ, издадено то РС „ПБЗН” - Петрич (задължително изискване за обекти III категория)
 - Съгласувателни писма с експлоатационни дружества, имащи отношение към обекта – „ВиК“ ЕООД–Петрич, „ЧЕЗ-Разпределение България“ АД, БТК ЕАД, „Овергаз“ АД, ЕСМ и др.
- 

- Технически проекти по следните части:
 - Част „Пътна“;
 - Част „Геодезия“
 - Част „План за безопасност и здраве“;

За обектите не е необходимо разработване на проект част „Пожарна безопасност“, тъй като строежите не са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица 1 към чл. 8, ал. 1., съгласно чл.4 (3) от Наредба Из-1971 от 29.10.2009 год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 69 от 2014 г.)

За обектите не е необходимо разработване на проект част „ПУСО“, тъй като съгласно *Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. (ДВ бр. 98 / 08.12.2017 год.)*

чл.15 ал.1 т.7 : План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат изискванията на тази глава при:.....

7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност **с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;**

IV. МЕТОДИ И СПОСОБИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР НА ОБЕКТА. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТАТА

В случай, че «Интерконтрол – 2000»ЕООД бъде избран за изпълнител, ние ще упражняваме дейностите по строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на *Разрешение за ползване за Обект III категория или Удостоверение за въвеждане в експлоатация за Обект IV категория*), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, а именно:

- ✓ законосъобразно започване на строежа;
- ✓ пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството съгласно ЗУТ и Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- ✓ изпълнение на строежа, съобразно одобрените инвестиционни проекти и конкретните изисквания към типа строеж, съобразно разпоредбите на чл.169, ал.1 от ЗУТ.
- ✓ спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- ✓ недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

За Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Удостоверение за въвеждане в



експлоатация или Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ, Ние предвиждаме изпълнение на следните дейности, разделени на три етапа, както следва:

НАЧАЛЕН ЕТАП:

Изграждане на обекта започва след получаване на Разрешение за строеж, подписването на Протокол обр. 2 и 2а и заверка на Обр.4 - заповедна книга, съгласно Наредба 3 за актове и протоколи по време на строителството.

Всички строително-монтажни работи трябва да се изпълняват в съответствие с одобрените проекти, изискванията на Възложителя, както и с изискванията на действащото българско законодателство.

За изпълнението на договора «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще ползва офиса си в гр. Петрич, намиращ се на ул. «Славянска» №7а, ет.2, ап.4 и основния си офис в гр. Благоевград. Двата офиса са оборудвани с необходимите средства за изпълнение на договора – обзавеждане, офис оборудване, транспорт и други.

Строителния надзор ще се изпълнява съгласно задълженията по чл. 168 от ЗУТ и изискванията на Договора. За целта на законосъобразното започване на строителството след издаване на Разрешение за строеж, строителния надзор ще открие строителната площадка и определи строителна линия и ниво /образец 2 и 2а / и ще завери заповедната книга /образец 4 / на обекта, за която ще обяви писмено Общината, РДНСК и специализираните контролни органи в 7-дневен срок.

- СТРОИТЕЛЕН ЕТАП:


При изпълнение на строителния надзор, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще присъства на строежа съобразено с работната програма на Изпълнителя на СМР. Чрез екипа от експерти ежедневно ще се следи извършените СМР да бъдат съгласно одобрените проекти и техническите норми и спазване условията по безопасност и охрана на труда – съгласно ПБЗ, опазване на околната среда и недопускане на увреждането на трети лица и имоти в следствие на строителството. Строителния надзор ще осъществява контрол за пълнота и правилно съставяне на протоколи и актове, съставени съгласно Наредба № 3/ ДВ бр. 72/2003г. по време на строителството, придружени със декларации за съответствие за използваните материали и удостоверява изпълненото строителство с необходимата документация за разрешаване ползването на строежа. Ще разрешава промени в изпълнението на СМР от одобрените проекти, само след съгласуване на промяната с Възложителя и Проектанта и в следствие ще изисква изготвяне на ексекутивна документация.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще представя на Възложителя доклади за отчитане изпълнението на СМР и спазването на строителния график, както и предстоящите задачи, съвместно с Изпълнителя на СМР и ще взема мерки за решаване на възникналите проблеми.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще осъществяваме **постоянен контрол върху изпълнението на СМР** относно:

- ✓ съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените проекти и КСС;



- 
- ✓ съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
 - ✓ съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.
 - ✓ Присъствие и контрол правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

В рамките на строителния процес ще извършваме проверки на място, които ще включват:


- ✓ проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с технически проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- ✓ проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект;
- ✓ проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Ако бъдем избрани за изпълнители, то ние:

- ✓ ще инспектираме изпълнението на СМР по всяко време,
- ✓ ще контролираме технологията на изпълнението, съгласно одобрените проекти
- ✓ ще изискваме отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение.
- ✓ В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите ще се спират, за което ще бъде уведомен и възложителя (Община Петрич)

Ние се задължаваме да следим за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценяваме забавата и да определяме какви мерки трябва да се вземат в това отношение. Съгласувано с Възложителя ще нареждаме извършването на изменения в графика или вземане решения по такива изменения, предлагани от изпълнителя.

Предвиждаме изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. На база одобрения от Възложителя и Консултанта проект по част “План за безопасност и здраве” към инвестиционния проект за строежа, експертът „Координатор по безопасност и здраве” от екипа ни ще контролира неговото спазване по време на строителството. В случай на необходимост, в зависимост от организацията за изпълнение на строежа (напр. едновременна работа на два участъка от строежа), Ние ще осигурим постоянно присъствие на съответния брой правоспособни лица, изпълняващи функциите на координатор по безопасност и здраве в строителството, както и на съответните експерти за упражняване на строителен надзор.



Ние се задължаваме да обърнем специално внимание за осъществяване на **контрол на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, Закон за техническите изисквания към**

продуктите (ЗТИП), Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще изисква от изпълнителя на СМР всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, да отговарят на изискванията на **НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България** и/или да се посочат номерата на действащи стандарти с технически изисквания към продуктите - БДС; БДС EN или еквиваленти или еквивалентни мерки, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN или еквиваленти или еквивалентни мерки, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение или еквивалент или еквивалентни мерки. Качеството на влаганите материали ще се доказва със сертификат или декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и печатана от производителя или негов представител - (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Ние ще изискваме влаганите строителни материали да бъдат придружени със сертификат или декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще изисква от изпълнителя на СМР предварително да посочи произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение и след доказване на съответствието им с наредбата да се пристъпи към доставка.

Сертификатът за произход трябва да бъде издаден от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.


«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД се задължава да извършва **контрол на Качеството на изпълнението на отделните видове работи** като изисква от изпълнителя на СМР да спазва нормите и нормативите за този вид строителство с цел осигуряване на качеството на изпълнение на отделните видове работи, съгласно действащата нормативна уредба, уреждаща изпълнението на строителния процес.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:

След завършване на строителството на обекта, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД чрез екипа от експерти:

- ✓ ще завери екзекутивната документация, съставена от Проектанта (ако се налага), съгласно изискванията на чл.175, ал. 2 от ЗУТ.
- ✓ ще участва при съставянето на констативен акт обр. „15” – съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.
- ✓ Активно ще сътрудничи с Възложителя и Изпълнителя на СМР по подготовката на необходимата документация и готовността на строителния обект за издаване на Разрешение за ползване;



- 
- ✓ ще изготви Окончателен доклад, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и ще го представи на Възложителя.
 - ✓ Ще изготви Технически паспорт за строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за съставяне на технически паспорти на строежите.
 - ✓ Ще представи Окончателния доклад и Технически паспорт за обекта чрез входирането им в деловодната система на Община Петрич.
 - ✓ Ще внесе от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено искане за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (за обект III категория).
 - ✓ Ще участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с изпълнения строеж, съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него (за обект III категория).
 - ✓ Ще представим на Възложителя разрешение за ползването на строежа (за обект III категория).

След приключване на дейността и предаване на Окончателния доклад, «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД ще предаде проектната документация и техническото досие за обекта на Възложителя с приемно-предавателен протокол.

Съгласно изискванията на Възложителя, всички документи ще се представят на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, всеки от които ще е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и „doc“, съответстващ на хартиения. Електронното копие на доклада ще се представя на CD носител.

Задължаваме се да изпълняваме дейностите по упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекта при стриктно спазване на изискванията на Възложителя, подробно описани в Техническата спецификация и Проектно-договора, неразделна част от документацията за участие в настоящата Обществена поръчка.

V. КОМУНИКАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ЕКСПЕРТИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В РАМКИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

За постигане целите на договора и безпрепятствено изпълнение на задълженията на строителен надзор **ние предвиждаме изпълнение на следните дейности:**

- Подбор на компетентен колектив от експерти, в т.ч. ръководител екип, които експертно и по всички части ще осигурят изпълнението на проекта;
- За успешно изпълнение и приключване на договора от ключово значение е правилно управление на проекта и правилния подбор на екип за осъществяването му. В тази връзка нашите усилия ще бъдат насочени към:
 - Осигуряване на компетентен Ръководител екип с дълъг управленчески стаж като цяло и конкретен специализиран стаж в цялостния инвестиционен процес на множество и разнообразни по своята същност обекти;
 - Осигуряване на експерти – инженери по отделните части на проекта, които ще следят тясно в различните специалности за точно изпълнение на одобрените



проекти, спазване на нормативната уредба и др., водещи до постигане целите на договора;

- Добра организация на работата, ясно задание на задълженията и отговорностите на екипа за изпълнение на проекта;
- Работа в насока добри взаимоотношения между всички участници в строителния процес – Възложителя (Община Петрич), Строителя на отделните обекти, Проектанти и Експерти – строителен надзор, което гарантира качество на изпълнение и бърза реакция при евентуални проблеми и начина на тяхното решаване.

Ние предвиждаме да информираме Възложителя за възникнали проблеми в процеса на строителство (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им.

Ако възникне необходимост от промени във видовете работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени - снимков материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми.

При нарушаване на техническите правила и нормативи при изпълнение на СМР ще уведомяваме Възложителя и РДНСК в 3-дневен срок от установяване на нарушението;

«ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000» ЕООД се задължава да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Ние и лицата, наети или ангажирани от нас във връзка с изпълнението на договора, няма да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която е предоставена или която е придобита по друг начин, няма да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, няма да използваме в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която е предоставена или получена в резултат на извършени в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

ЕКСПЕРТЕН ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА

Ръководител екип инж. Христо Димитров Алексов е строителен инженер-магистър, специалност „Транспортно строителство“, с диплома за завършено образование от ВИАС София.

Инженер Алексов притежава 39 години общ професионален стаж, от които над 20 год. стаж като строителен надзор и инвеститорски контрол, има богат опит в инвестиционния процес при реализирането на проекти от различно естество, като



ръководител на екип експерти в областта на строителния надзор и инвеститорски контрол.

Инж. Алексов е Управител на „ДЕЛТА КОНСУЛТ ВХ“ООД. Фирмата притежава Удостоверение № РК-0215 / 09.06.2014 г. на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ, чл.7,ал.1, чл.11, ал.1, вр.чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Като Ръководителят на екипа от експерти инж. Алексов ще има следните основни задължения и отговорности:


- Осъществява обмена на информация между Изпълнителя на настоящата обществена поръчка и Възложителя /Община Петрич/;
- Присъства на всички срещи, организирани от Възложителя, във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.
- Извършва управление и координиране на дейностите на екипа от експерти;
- Подготвя и съгласува взаимната кореспонденция до Община Петрич във връзка с изпълнението на задълженията по договора за настоящата обществена поръчка;
- Инициира, организира и подготвя всички необходими документи за срещите за напредъка на изпълнението по договора;
- Участва в процеса на съгласуване и одобряване на строителния процес;
- Контролира съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.
- Подпомага и сътрудничи в подготовката на всякакви обществени кампании или медийни изяви, за които възложителят счете за необходимо да го покани да участва или да поиска съдействието му;
- Застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;
- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.

Ръководителят на екипа ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

2. ИНЖЕНЕР ПО МАТЕРИАЛИТЕ

Инж. Владимир Иванов Стефанов е строителен инженер-магистър, специалност „Промислено и гражданско строителство“, с диплома за завършено образование от ВИАС София,

Инженер **Стефанов** притежава **16 години общ професионален стаж, от които 5 год. стаж като експерт - строителен надзор по част „Конструкции“**, има добър опит в инвестиционния процес при строителство на обекти от различно естество.




Инженер **Стефанов** притежава Сертификат р.№ 2387/21.05.2018 г. за завършен курс по: „**Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на вложенията в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност**“. Срок на валидност на сертификата – 1 год. (до 20.05.2019 год.).


Сертификатът е издаден от Център за професионално обучение „МИКС“ гр. Казанлък, Лиценз № 200312149, тел. 0431/63293; GSM: 0897 948 214.

Инж. Стефанов е вписан в списъка на квалифициран персонал, приложен към удостоверението на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Експертът по материалите **инж. Стефанов** ще има следните **основни задължения и отговорности**:

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си като **инженер по качество на материалите**.
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа като **инженер по качество на материалите**
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за осъществяване на контрол на качество на вложенията строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност, Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).
- При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) следи да се предвиждат, а при изпълнението им да се вложат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ, както следва:
 - носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
 - безопасност в случай на пожар;
 - хигиена, здраве и околна среда;
 - достъпност и безопасност при експлоатация;
 - защита от шум;
 - устойчиво използване на природните ресурси.

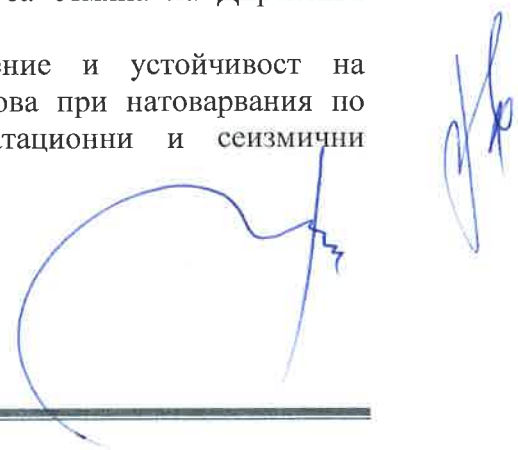

- 
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
 - Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Инженерът по качество на материалите ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

3. ИНЖЕНЕР ПО ЧАСТ «ГЕОДЕЗИЯ»




Инж.Малина Александрова Делева е Магистър - Инженер по Геодезия, фотограмметрия и картография с диплома за завършено образование от ВИСИ София, притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен №05653 и Свидетелство за извършване на дейности по кадастъра и е вписана в регистъра по чл.12 от ЗКИР под рег. № 716.


Инженер Делева притежава 43 години общ професионален опит, от които **9 год. стаж като консултант строителен надзор по част „Геодезия“** към «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД.

Инж. Делева е **вписана в списъка на квалифициран персонал**, приложен към лиценза на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.).

Експерт – инженер по част «Геодезия» **инж. Малина Делева** ще има следните **основни задължения и отговорности:**

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
 - Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част „Геодезия“;
 - Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част „Геодезия“;
 - Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.
 - Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част „Геодезия“;
 - Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
 - Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;
 - Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в Договора за изпълнение;
 - Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- 



- 
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Инженерът по част «Геодезия» ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

4. ИНЖЕНЕР ПО ЧАСТ « ПЪТНА»

Инженер по част «Пътна» **инж. Любомир Сократов Спиров** е Магистър – строителен инженер по транспортно строителство – пътно строителство с диплома за завършено висше образование от ВИАС гр.София.

Инженер Спиров притежава **39 години професионален опит** в проектирането, строителството и супервизията в пътния сектор. Отлично владее работата на строителния надзор.

Има отлична техническа подготовка и експертни умения, включващи и производството на асфалтови смеси и полагането им за строителство и ремонт на пътища. Запознат е добре с организацията на лабораторния контрол при изграждане и ремонт на пътища и отличен опит в организацията на движението.

Има богат опит в упражняване на строителен надзор при спазване на разпоредбите на българската нормативна уредба, много добри познания по ЗУТ и Договорните условия на ФИДИК.

Имам богат опит в изпълнение на проекти за строеж на пътища.

Инж. Л. Спиров е **вписан в списъка на квалифициран персонал**, приложен към лиценза на «ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000»ЕООД в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/2003г.).

Инженер по част «Пътна» **инж. Любомир Сократов Спиров** ще има следните **основни задължения и отговорности:**

- Осъществява обмен на информация с ръководителя на екипа и останалите участници в екипа;
- Отговаря за извършването на работите, в съответствие с договора за обществената поръчка в областта на компетенциите и правомощията си по част „Пътна“;
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си по част „Пътна “;
- Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.
- Изготвя доклади до ръководителя на екипа, по отношение на отчета от извършената работа по част „Пътна“;
- Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
- Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;



- Стриктно и безусловно спазва всички задължения, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на настоящата обществена поръчка в Договора за изпълнение;
- Изпълнява и други дейности, изрично неупоменати по-горе, но следващи се от договора за настоящата обществена поръчка и българското законодателство.
- Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми, възникнали в хода на строителството, като представя съответни решения.

Инженер по част «Пътна» ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

5. ИНСПЕКТОР / КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Инспектор / Координатор по безопасност и здраве инж.Георги Христов Милев с строителен инженер-магистър, специалност „Хидротехническо строителство“, с диплома за завършено образование от ВИАС София, и притежава:

- Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с регистрационен №12252,
- Удостоверение Курс III-№049 / 2004г. за Координатор по безопасност и здраве (безсрочно, валидно и към момента).
- Удостоверение № 00181 / 04.06.2013 год. за успешно завършен пълен курс на обучение по пожарна безопасност, съгласно Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар;


Инженер Милев притежава 38 години общ професионален стаж, от които 32 год. стаж като строителен надзор и инвеститорски контрол, има богат опит в инвестиционния процес при реализирането на проекти от различно естество, като ръководител на екип експерти в областта на строителния надзор и инвеститорски контрол.

Инж. Милев е Управител на **”ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000”ЕООД**. Фирмата притежава Удостоверение № РК-0215 / 09.06.2014 год. на основание чл.166, ал.2 от ЗУТ, чл.7,ал.1, чл.11, ал.1, вр.чл.8 от Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 год. за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

Като Експерт - Координатор по безопасност и здраве инж.Георги Христов Милев ще има следните *основни задължения и отговорности*:

- Ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи, включително изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба.
- Осъществява обмен на информация с останалите участници в екипа;



- 
- Управлява и координира работата по договора в областта на компетенциите и правомощията си като Координатор по безопасност и здраве.
 - Отговаря за съответствието на изпълнението със законодателството и разпоредбите на правилата за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.
 - Следи за законосъобразно извършване на работата по договора;
 - Следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

Експерт - Координатор по безопасност и здраве ще е на разположение през целия период на изпълнение на договора.

Всички експерти в екипа на "ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000" ЕООД са независими и не са в условие на конфликт на интереси при осъществяване на възложените им отговорности като експерти по строителен надзор.

Представяме график на дейностите, които ще изпълняват отделните експерти в процеса на изпълнение на договора с конкретно описани функции за изпълнение на задачите им по специалности. Графикът отразява последователността, времетраенето и ресурсната обезпеченост за изпълнение на дейностите по строителен надзор на обекта.

Приложение: График за изпълнение на дейностите по договора.

**VI. ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАТО
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ОТ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПОРЪЧКАТА**

Ние, "ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000" ЕООД притежаваме Сертификат № 35990/17/S, издаден на 18.12.2017 год. с валидност до 17.12.2020 год., удостоверяващ, че системата за управление на качеството на "ИНТЕРКОНТРОЛ - 2000" ЕООД съответства на стандарт **ISO 9001:2015**

С област на приложение: Проектиране, оценка на съответствието на проекти, независим строителен надзор и цялостно изготвяне и управление на инвестиционни проекти, проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълнявани СМР с договорите за изпълнение на строителството.

Сертификатът е издаден от „РИНА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 200337457 в качеството си на дружество, предоставящо акредитирани сертификационни услуги под глобалните акредитации на RINA Services SpA.

Основните ни цели за постигане на добро ниво на качество:

- ✓ Повишаване качеството на труда и конкурентноспособността ни;
- ✓ Подобряване на фирмения имидж чрез намаляване на професионалния риск при упражняване на строителен надзор.



Вътрешните норми на фирмата ни за осигуряване на качеството акцентират върху:

- ✓ Прилагане на принципи за управление на дейността, заложен в нормативните актове;
- ✓ Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол за свързаните с работата опасности и професионални рискове.
- ✓ Осигуряване на навременно и ефективно обучение и квалификация на специалистите, включени в списъка ни към лиценза за упражняване на дейността по строителен надзор.

За да бъдат извършени в пълно съответствие с техническото задание, тръжната документация, нормативните актове и разпорежданията от страна на възложителя. Всички строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на обекта трябва да отговарят на обявените от Възложителя условия. Всички материали да бъдат придружени със сертификат за съответствие и/или качество.

Контролът на качеството на извършените СМР от строителя ще се извършва на организационни нива: Ръководител екип и квалифициран експерт СИ.

Вътрешен контрол, който ще осъществяваме, съответстващ на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация:

За осъществяване на вътрешния контрол на подобектите, ние ще определим лице, което ще изпълнява длъжността «Вътрешен контрол от страна на Строителния надзор» и ще отговаря за количеството и качеството на извършените контролни проверки за изпълнените СМР от Строителя на обекта. Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, контрол на количеството на изпълнени СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР от строителя на обекта.

Контрол на качеството на доставените материали

Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на материалите и лично се убеждава в необходимото качество на материалите. В случай, че материалите не отговарят на изискванията или не са придружени с необходимия сертификат, не се допуска влягането му в обекта. Уведомява Управителя на фирмата за строителен надзор и същите се връщат обратно.

Контрол за качеството на извършените СМР

Ако се изисква с договора, Вътрешният контрол извършва измерване количествата на извършените СМР и извършва сравнение с измерените количества от страна на строителя. Измерванията се извършват съгласно Правилник за изпълнение и приемане на СМР – ПИПСМР.

Контрол на качеството на изпълнените СМР от строителя на обекта

Вътрешният контрол от страна на Строителния надзор извършва контролиране на качеството на изпълнените СМР и ако има некачествено изпълнени работи, същите не се приемат от страна на Строителния надзор и подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Вътрешният контрол извършва проверка на съответствие на изпълнените СМР с работния проект, вложените материали, почистване след завършване на работата и др.



2. Срокът за изпълнение на строителния надзор е съобразен с периода за изпълнение на строителните дейности за съответния обект и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво (Акт Образец № 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за обекта и приключва с издаване на разрешение за ползване на съответния обект.

3. Срокът за изготвяне на окончателен доклад до възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа е **5 /пет/** календарни дни след приключване на СМР, удостоверено с подписан Констативен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за сградата съобразно Техническото предложение на изпълнителя.

4. Срокът за съставяне на технически паспорт, е **5 /пет/** календарни дни, считано от подписване на Констативен акт обр. 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответната сграда съобразно Техническото предложение на изпълнителя.

5. Срокът за внасяне на необходимите документи за назначаване на приемателна комисия е **1 /един/** работен дн от регистриране на технически паспорт съобразно Техническото предложение на изпълнителя.

ДАТА: 29.05.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Инж. Георги Милев.....

Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният : **инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ**

(собствено, бащино, фамилно име)

с постоянен адрес: гр.(с) **Благоевград**, община **Благоевград**,
област **Благоевград**, ул. „**Васил Левски**“ № 45А, ет. 5, ап. 10,
в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**,
на участник «**ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000**» **ЕООД**, **ЕИК 101797055**

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строително-монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100; BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде **6 (шест)** календарни месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: **29.05.2018 г.**

Декларатор:



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният : **инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ**

(собствено, бащино, фамилно име)

с постоянен адрес: гр.(с) **Благоевград**, община **Благоевград**,
област **Благоевград**, ул. „**Васил Левски**“ № 45А, ет. 5, ап. 10,
в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**,

на участник «**ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000**» ЕООД , ЕИК **101797055**

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строително-монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100; BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 29.05.2018 г.

Декларатор:

(подпис и печат)



Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният : **инж. ГЕОРГИ ХРИСТЕВ МИЛЕВ**

(собствено, бащино, фамилно име)

с постоянен адрес: гр.(с) **Благоевград**, община **Благоевград**,
област **Благоевград**, ул. „**Васил Левски**“ № 45А, ет. 5, ап. 10,

в качеството си на **УПРАВИТЕЛ**,

на участник «**ИНТЕРКОНТРОЛ – 2000**» ЕООД , ЕИК 101797055

(наименование на участника)

в процедура за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строително-монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път: BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634; BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84; BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100; BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Запознат съм с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 29,05,2018 г.

Декларатор:

