



ПРОТОКОЛ № 2

на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1**

по обособени позиции:

⇒ **Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;**

⇒ **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1.**

Заседанието на Комисията, назначена със Заповед I–C -182 от 18.09.2018 г. Кмет на Община Петрич Димитър Петров Бръчков, се състоя на 19.10.2018г. от 10.00 часа, в сградата на Община Петрич с адрес гр. Петрич, ул. "Цар Борис Трети" №24.

Комисията заседава в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов със сл. адрес- гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, Главен инженер при Общинска администрация- гр. Петрич, квалификация: инженер- конструктор

Членове:

1 . Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност „Юрисконсулт” при Общинска администрация – гр. Петрич и

2.инж.Галина Миланова Терзиева – старши експерт „ВиК и газ” в Дирекция „Устройство на територията и регионално развитие,, при Общинска администрация- гр. Петрич.

Комисията установи, че в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. „Обединение „Хая Строй 2018 „ ДЗЗД - вх. № 92-00-3359-002/16.10.2018г. по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2

2."Теракоминженеринг" ЕООД - вх. № 92-00-3358-002/18.10.2018г. по обособена позиция № 2.

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва:

Участникът **„Обединение „Хая Строй 2018 „ ДЗЗД** е представил следните документи на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП:

- декларация за срока на валидност на Застраховка професионална отговорност в проектирането и строителството по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2;

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител по Обособена позиция № 1 за обединение „Хая Строй 2018 „ДЗЗД; „Хая –С” ООД и „Вера Строй” ЕООД и

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител по Обособена позиция № 2 за обединение „Хая Строй 2018 „ДЗЗД; „Хая –С” ООД и „Вера Строй” ЕООД и

Участникът **”Теракоминженеринг” ЕООД** не е представил документи на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП по обособена позиция № 1 :

Участникът **”Теракоминженеринг” ЕООД** е представил следните документи на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП по обособена позиция № 2.

- опис на представените документи от участника по обособена позиция № 2 ;
- ЕЕДОП на хартиен носител;
- ЕЕДОП на оптичен носител;
- декларация в свободен текст за осигуряване на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ ;
- застрахователна полица;
- удостоверение за добро изпълнение;
- сертификат за регистрация ISO 9001: 2015 и
- сертификат за регистрация ISO14001: 2015

Комисията пристъпи към разглеждането на документите, представени от участниците, включително допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП.

УЧАСТНИК № 1. „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, град Пловдив, с вх.№ 92-00-3358/17.09.2018г. в 10:44 часа, с посочен адрес за кореспонденция: град Пловдив, п.к.4003, ул.„Дилянка” № 35, по:

⇒ **Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1.**

С оглед констатациите на комисията и взетите решения, отразени в Протокол № 1, комисията на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП изиска от участника да представят допълнителни документи.

Комисията установи, че в посочения срок (17,00 часа на 18.10.2018 г.) не са постъпили изискваните с Протокол № 1, окончателно подписан на 10.10.2018г. допълнителни документи от посочения по – горе участник по Обособена позиция № 1.

С оглед на установеното по – горе комисията единодушно взе следното :

РЕШЕНИЕ

На основание чл.54, ал.1, т.5, б.“б“ от ЗОП **ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ –КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ДА ОТСТРАНИ** участника „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, от участие в обществена поръчка с предмет : „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 **в частта по обособени позиции: 1** – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, *поради непредставяне в срок на изискваната се информация, свързана с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на участниците поставени от Възложителя*, посочена в протокол №1 от работата на комисията.

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП, комисията няма да разглежда техническото предложение на участника „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в частта **по обособена позиция № 1**, поради това, че офертата на участника не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Решението е взето единодушно.

УЧАСТНИК №1. „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, град Пловдив, с вх.№92-00-3358/17.09.2018г. в 10:44 часа, с посочен адрес за кореспонденция: град Пловдив, п.к.4003, ул.„Дилянка” № 35, по:

⇒ **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1.**

⇒

Участникът е представил следните документи:

- опис на представените документи от участника по обособена позиция № 2 ;
- ЕЕДОП на хартиен носител;
- ЕЕДОП на оптичен носител;
- Декларация в свободен текст за осигуряване на валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ ;
- застрахователна полица;
- удостоверение за добро изпълнение;
- сертификат за регистрация ISO 9001: 2015 и
- сертификат за регистрация ISO14001: 2015.

След разглеждането на документите, представени от участника „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД включително допълнителните документи, представени на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП, комисията установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.

Предвид горното, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

ДОПУСКА участника „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническото предложение по обществена поръчка, с предмет:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 в частта, по

Обособена позиция 2

„Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1.

Решението е взето единодушно.

Участник № 2 ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018”ДЗЗД, с участници в обединението - „Хая –С” ООД и „Вера Строй” ЕООД,

Участникът е представил нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на оптичен носител по Обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 за обединение „Хая Строй 2018 „ДЗЗД; „Хая –С” ООД и „Вера Строй” ЕООД и

След разглеждането на документите, представени от участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018”ДЗЗД**, включително допълнителните документи, представени на основание чл.54, ал. 9 от ППЗОП, комисията установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.

Предвид горното, комисията взе следното решение:

ДОПУСКА участника **ОБЕДИНЕНИЕ „ХАЯ СТРОЙ 2018”ДЗЗД**, до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения по обществена поръчка с предмет, „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

по обособени позиции:

Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1;

Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1

Решението е взето единодушно.

С това заседанието приключи и комисията взе решение да продължи работата си в следващо закрито заседание на 23.10.2018 г.

Днес 23.10.2018 г., комисията в пълен състав продължи своята работа.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „оптимално съотношение качество/цена”.

По смисъла на чл.31, ал.1, т.3 от ЗОП възложителят е разработил в документацията Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и начина за определяне на оценката по всеки показател, съдържаща се в последната.

Избраният критерий за възлагане е посочен в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

В съответствие с разпоредбата на чл.70, ал.7, т.3, б.„а“ от ЗОП – начина за определена на оценката по всеки показател осигурява на участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за количествено определените показатели са определени стойностите в цифри и е посочен начина за тяхното изчисляване.

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка“, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка показатели.

Показатели за оценка

K1 – Предложена цена – максимална оценка – 40 точки;

K2 – Организация за изпълнение на поръчката – 60 точки;

K1 – Предложена цена – показателят се изчислява по следната формула:

$$K1 = (C_{\min} / C_i) \times 40$$

където

C_i е предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник,

където $C_{\min}$ е минималната предложена крайна обща цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска обща цена.

Ще бъде отстранен от процедурата участник, на който за ценовото предложение е установено някое от следните обстоятелства:

- ✓ В Ценовото предложение не са представени изискваните показатели за ценообразуване.
- ✓ Предложената цена надхвърля предварително обявената максимална стойност.
- ✓ Има аритметични грешки при извършване на аритметичните действия.

K2 – Организация за изпълнение на поръчката – в техническото си предложение участникът трябва да посочи организацията за изпълнение на строителството съгласно

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като след проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане, Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценявано по качествени критерии – а именно мотивираното наличие (не просто формално включване) на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо просто постигането на заложените резултати.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, само гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с минималния брой точки по скалата по-долу, КАТО в случай че спрямо него може да бъде заключено наличието на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи съответната оценка съгласно таблицата по-долу.

Организация за изпълнение на поръчката	макс. 60
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.	5
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на	25

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експертите, предвидени от участника (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници, организация по подsigуряване на ресурсите и др.) са посочени конкретните задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачата; 3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка , с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън прякото изпълнение на СМР, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.	
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експертите, предвидени от участника (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници, организация по подsigуряване на ресурсите и др.) са посочени конкретните задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачата; 3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка , с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. 4. Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън прякото изпълнение на СМР, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.	40
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация. - участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други	60

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложените дейности.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични и **четирите** обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експертите, предвидени от участника (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници, организация по подsigуряване на ресурсите и др.) са посочени конкретните задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачата;

3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън прякото изпълнение на СМР, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.

В случай, че оферта на участник не отговаря на минималните изисквания, за които се присъждат 5 т.и/или в приложените Линеен график, диаграма на работната ръка и диаграми на механизацията се установят несъответствия спрямо срокове, дейности и отговорности описани в техническото предложение, участникът ще бъде отстранен.

Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = K1 + K2$$

КО има максимална стойност 100 точки.

1. След внимателен преглед на представеното техническо предложение от участника **Участник – “Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД по обособена позиция №1**, комисията установи следното:

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т.1 от ППЗОП, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участника Участник – “Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД по обособена позиция № 1:

В своето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, по Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1** е предложил гаранционен срок за изпълнение, както следва:

- за преносни разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 5 години (обособена позиция 1);

Декларирал е следното: Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договора. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажните работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката **120 (сто и двадесет)** календарни дни от датата на съставяне на Акт обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В представената от Участника организация за изпълнение на поръчката е посочено изпълнението на всеки участък в четири основни етапа: Етап I - Подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; Етап II – Изкопни и демонтажни работи: рязане и разрушаване на асфалтови настилки, разрушаване на трошено каменна настилка, направа на ръчни и машинни изкопи за полагане на тръбната мрежа; Етап III – Изграждане на водопроводни клонове, изграждане на сградни водопроводни отклонения и монтаж и изпитване на съоръжения (спирателна арматура) и дезинфекция на водопровода; Етап IV – Засипване на водопровода с първо 30 см пясък и след това със земни маси и тяхното трамбоване. Представил е организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, като е направил описание на разпределение на отговорностите и дейностите между тях.

Посочил е начина на комуникация с Възложителя. Подробно е описал изпълнение на задачите и дейностите на изпълнителя, както и представяне на организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти, съобразно спецификата на задачите. Участникът в табличен вид е представил разпределение на експерти, ресурси и механизация за изпълнение на задачите и дейностите, предмет на поръчката. Направил е подробно описание на технологичната последователност на изпълнението на поръчката във три фази: начална фаза, изпълнение на строителните работи и отчитане на изпълнените строителни и приемателни комисии, дейности по приемане на строежа.

Описал е подробно подготовка на площадката, земни работи, полагане на водопроводи, обратна засипка, обратен насип, уплътняване, отводняване и възстановяване. Разписани са начина на полагане на полиетиленови водопроводи, съоръжения и фитинги, и тяхното изпитване и дезинфекция. Посочени са мерки и дейности за вътрешен контрол, както и мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Представен е анализ на възможните външни рискове при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляването им.

Представен е линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Решение на комисията:

Прилагайки разписната от възложителя методика за определяне на оценката на техническите предложения **по показател K2 – Организация за изпълнение на поръчката**, комисията единодушно реши офертата на участник **“Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД по обособена позиция № 1** да получи **40 точки**.

Мотиви и аргументи на комисията:

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател K2 – Организация за изпълнение на поръчката

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на **минималните изисквания** на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация.

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности.

В представената от Участника организация за изпълнение на поръчката е посочено изпълнението на всеки участък в четири основни етапа: Етап I - Подготовка на строителната площадка и създаване на временна организация на движение; Етап II – Изкопни и демонтажни работи: рязане и разрушаване на асфалтови настилки, разрушаване на трошено каменна настилка, направа на ръчни и машинни изкопи за полагане на тръбната мрежа; Етап III – Изграждане на водопроводни клонове, изграждане на сградни водопроводни отклонения и монтаж и изпитване на съоръжения (спирателна арматура) и дезинфекция на водопровода; Етап IV – Засипване на водопровода с първо 30 см пясък и след това със земни маси и тяхното трамбоване. Представил е организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, като е направил описание на разпределение на отговорностите и дейностите между тях.

Посочил е начина на комуникация с Възложителя. Подробно е описал изпълнение на задачите и дейностите на изпълнителя, както и представяне на организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти съобразно спецификата на задачите.

Описал е подробно подготовка на площадката, земни работи, полагане на водопроводи, обратна засипка, обратен насип, уплътняване, отводняване и възстановяване. Разписани са начина на полагане на полиетиленови водопроводи, съоръжения и фитинги, и тяхното изпитване и дезинфекция. Посочени са мерки и дейности за вътрешен контрол, както и мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, като са налични **три** от изискуемите четири обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експертите, предвидени от участника (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

• Участникът подробно е описал изпълнение на задачите и дейностите на изпълнителя, както и представяне на организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти съобразно спецификата на задачите. Участникът в табличен вид е представил разпределение на експерти, ресурси и механизация за изпълнение на задачите и дейностите, предмет на поръчката.

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници, организация по подsigуряване на ресурсите и др.) са посочени конкретните задължения на отговорния/те за изпълнението й експерт/и съобразно спецификата на задачата;

• За всяка задача участникът е определил необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти съобразно спецификата на задачата.

3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

• Посочени са мерки и дейности за вътрешен контрол и е представена обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката

4. Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън прякото

изпълнение на СМР, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

•Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, като: мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности и анализ на възможните външни рискове при изпълнение на поръчката, и мерки за преодоляването им, които са подробно описани, **но не е достатъчно обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.**

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на участника **“Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД**, оферта вх.№ 92-00-3359 от 17.09.2018 година по обществена поръчка с предмет : **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 в частта по Обособена позиция 1 – Извършване на строително-монтажни работи по част „Водоснабдяване” на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1** са налице всички условия за присъждане на оценка в размер на **40,00 (четиридесет) точки (при предложена организация за изпълнение на поръчката, в която са налични три от надграждащите обстоятелства, посочени в методиката като основание за присъждане на по-висока оценка, следва да се присъди оценка от 40 точки),** поради което и определя тази оценка по Показател **„Организация за изпълнение на поръчката” – К2.**

2. След внимателен преглед на представеното техническо предложение от участника **Участник –“Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД по обособена позиция №2,** комисията установи следното:

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участника Участник – “Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД по обособена позиция №2.

В своето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, по Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки,** на обект **„Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1** е предложил гаранционен срок за изпълнение, както следва:

- за основен ремонт на път - 2 години (за обособена позиция 2).

Декларирал е следното: Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договора. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката **90 (деветдесет) календарни дни** от датата на съставяне на Акт обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за

приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката, като е предвидил работна програма за изпълнение на поръчката. Предвидил е изпълнението на поръчката да бъде в три етапа: подготовка на строителството, изпълнение на строителството, лабораторни проби и изпитвания и предаване на строителството, като за всеки етап е представил подробно описание. Разписани са видовете СМР и технология на изпълнение.

Подробно е описал изпълнение на задачите и дейностите на изпълнителя, както и представяне на организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти съобразно спецификата на задачите. Участникът в табличен вид е представил разпределение на експерти, ресурси и механизация за изпълнение на задачите и дейностите, предмет на поръчката. Разписана е комуникация с Възложителя и участниците в строителния процес. Определил е ръководния и експертен персонал и е описал неговите задължения и отговорности. Представено е подробно описание на Технологиите на изпълнение на строително-монтажните работи. Подробно са описани мерки за контрол с цел осигуряване на качеството и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. Описани са потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора.

Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Решение на комисията:

Прилагайки разписната от възложителя методика за определяне на оценката на техническите предложения по **показател К2 – Организация за изпълнение на поръчката**, комисията единодушно реши офертата на участник **“Обединение Хая строй 2018” ДЗД по обособена позиция № 2** да получи **40 точки.**

Мотиви и аргументи на комисията:

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател К2 – Организация за изпълнение на поръчката

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на **минималните изисквания** на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- *участникът е представил организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката, съгласно Техническата спецификация.*

- *участникът е предложил организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в поръчката, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените дейности.*

Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката, като е предвидил работна програма за изпълнение на поръчката. Предвидил е изпълнението на поръчката да бъде в три етапа: Подготовка на строителството, Изпълнение на строителството, лабораторни проби и изпитвания и Предаване на строителството, като за всеки етап е представил подробно описание. Разписани са видовете СМР и технология на изпълнение.

Подробно е описал изпълнение на задачите и дейностите на изпълнителя, както и представяне на организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти съобразно спецификата на задачите.

Разписана е комуникация с Възложителя и участниците в строителния процес. Определил е ръководния и експертен персонал и е описал неговите задължения и отговорности. Представено е подробно описание на Технологиите на изпълнение на строително-монтажните работи.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, като са налични **три** от изискуемите четири обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експертите, предвидени от участника (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати);

- Участникът подробно е описал изпълнение на задачите и дейностите на изпълнителя, както и представяне на организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението ѝ експерти съобразно спецификата на задачите. Участникът в табличен вид е представил разпределение на експерти, ресурси и механизация за изпълнение на задачите и дейностите, предмет на поръчката.

2. За всяка задача са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация, работници, организация по подsigуряване на ресурсите и др.) са посочени конкретните задължения на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и съобразно спецификата на задачата;

- За всяка задача участникът е определил необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението ѝ експерти съобразно спецификата на задачата.

3. Предложени са мерки и дейности за вътрешен контрол и обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

- Посочени са мерки и дейности за вътрешен контрол и е представена обвързаност с организацията на работата на екипа от експерти, отразяващи конкретната специфика на настоящата поръчка, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката

4. Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън прякото изпълнение на СМР, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

- Посочени са и други организационни дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, като мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности и опазване на околната среда по време на изпълнение на поръчката, които са подробно описание, но не е достатъчно обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението на участника **“Обединение Хая строй 2018” ДЗЗД**, оферта вх.№ 92-00-3359/17.09.2018г. по **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1** са налице всички условия за присъждане на оценка в размер на **40,00 (четиридесет) точки (при предложена организация за изпълнение на поръчката, в която са налични три от надграждащите обстоятелства, посочени в методиката като основание за присъждане на по-висока оценка, следва да се присъди оценка от 40 точки)**, поради което и определя тази оценка по Показател „Организация за изпълнение на поръчката” – К2.

3. След внимателен преглед на представеното техническо предложение по обособена позиция № 2 от участника – **“ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД** по обособена позиция №2, комисията установи следното:

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП, съдържа изисканите документи, като същите са представени в изискуемата форма.

Кратко описание на предложението на участника – “ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по обособена позиция №2.

В своето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки**, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 участникът е предложил гаранционен срок за изпълнение, както следва:

- **за основен ремонт на път - 5 години (за обособена позиция 1).**
- **за основен ремонт на път - 10 години (за обособена позиция 2).**

Предложеният по-горе гаранционен срок **5 години (за обособена позиция 1)** е по-малък от **минималния гаранционен срок - 8 години съгласно** чл.20, ал.4, т.7 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предложеният гаранционен срок **10 години (за обособена позиция 2)** е по-дълъг от 2 /два/ пъти минималния гаранционен срок.

Декларира е следното: Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта съгласно Договора. Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България на МРРБ, ДВ бр.14/20.02.2015г. Съответствието се установява по реда на Наредбата. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация и проекта. Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката **90 (деветдесет)** календарни дни от датата на съставяне на Акт обр.2а по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката, в която на стр.1 е посочил следното: *„в случай, че бъдем избрани за Изпълнител ще изготвим проект за Временна Организация на Движението (ВОД) за осигуряване на нормални условия за движение на превозните средства.”* Предмета на поръчката е **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки**. Проекта по част ВОД е изготвен, поръчката не включва изпълнение на проектиране.

На стр.6 участникът е посочил, че ще изработи и представи за съгласуване работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС) и е описал съдържанието на проекта. Участникът е посочил, че ще спазва задължително всички на ЗБУТ и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Описал е методи за полагане на тръбопроводната мрежа, технологичната последователност и изисквания за изпълнение, като е описал дейности: подготовка на площадките, подземни инфраструктури, разчистване на площадките, земни работи, изкопни работи, обезводняване на изкоп, обратен насип, изкоп на траншеи, обратна засипка на тръбопроводите, монтаж и полагане на тръбопроводите и съоръжения към водопроводната мрежа, изпитване и дезинфекция на водопроводите, възстановяване и озеленяване.

Участникът е предвидил да изпълни дейности и последователност на изпълнение, които не са относими към изпълнение на обекта по **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки.**

Представил е в табличен вид описание на техническото оборудване, с което разполага.

Представил е организация на изпълнението на обекта, включваща необходимите ресурси за нейното изпълнение, като са посочени конкретните задължения на отговорните за изпълнението й експерти съобразно спецификата на задачите. Описал е осигуряване на контрол на качеството на изпълнение и качеството на материали.

Разписана е комуникация с Възложителя и участниците в строителния процес. Посочил е план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка. Предложил е мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително и местата със специфични рискове които могат да възникнат и да окажат влияние върху изпълнението на договора.

Представил е линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото НЕ СЪОТВЕТСТВА на предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, като поради това и на основание чл.107, т.2, б. «а» от ЗОП, комисията ПРЕДЛАГА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Кмета на община Петрич за отстраняване от участие в обществена поръчка, с предмет, „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, в частта по обособена позиция: 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 участника и не го допуска до разглеждане, оценяване и класиране на следващ етап от процедурата.

Мотиви и аргументи на комисията:

В своето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, по обособена позиция: Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки, на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич” ЕТАП 1 участникът е предложил гаранционен срок за изпълнение, както следва:

- за основен ремонт на път - 5 години (за обособена позиция 1).
- за основен ремонт на път - 10 години (за обособена позиция 2).

Предложеният гаранционен срок по обособена позиция № 2 от 10 години е по-дълъг от 2 /два/ пъти минималния гаранционен срок.

Минималният гаранционен срок съгласно чл. 20, ал.4, т.8 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е 2 години, т.е участникът е предложил гаранционен срок е два пъти по-дълъг от минималния гаранционен срок.

Не е изпълнено условието, поставено в документацията за участие:

Указание: Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4, т.7 и 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4, т. 7 и 8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимума, посочен по-горе, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП : „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия”, както и чл.39, ал.1 от ППЗОП:

Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката, в която на стр.1 е посочил следното: „в случай, че бъдем избрани за Изпълнител ще изготвим проект за Временна Организация на Движението (ВОД) за осигуряване на нормални условия за движение на превозните средства.” Предмета на поръчката е **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с.Първомай, община Петрич” ЕТАП 1, по обособена позиция: Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки. Проектът по част ВОД е изготвен, поръчката не включва изпълнение на проектиране.**

На стр.6 участникът е посочил, че ще изработи и представи за съгласуване работен проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС) и е описал съдържанието на проекта. Участникът е посочил, че ще спазва задължително всички на ЗБУТ и Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Описал е методи за полагане на тръбопроводната мрежа, технологичната последователност и изисквания за изпълнение, като е описал дейности: подготовка на площадките, подземни инфраструктури, разчистване на площадките, земни работи, изкопни работи, обезводняване на изкоп, обратен насип, изкоп на траншеи, обратна засипка на тръбопроводите, монтаж и полагане на тръбопроводите и съоръжения към водопроводната мрежа, изпитване и дезинфекция на водопроводите, възстановяване и озеленяване.

Участникът е предвидил да изпълни дейности и последователност на изпълнение, които не са относими към изпълнение на обекта по **Обособена позиция 2 - Извършване на строително-монтажни работи по част „Пътна” – възстановяване на пътните настилки и не съответсват на поставената от Възложителя техническа спецификация за същата обособена позиция.**

Неизпълнение на условие в документацията е обстоятелство, което прави офертата неподходяща (съгласно §2 т.25 ДР на ЗОП) спрямо изискванията на Възложителя.

След като участникът е подал неточно техническо предложение, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в конкретната обществена поръчка.

Съгласно гореизложените констатации и мотиви, на основание чл.107, т.2, б. «а» от ЗОП, комисията не приема офертата на участника, подадена като несъответстваща на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, при което не е изпълнил условията, посочени в документацията за обществена поръчка, и офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което комисията предлага участникът “ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, Оферта с Вх.№92-00-3358/17.09.2018година да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника **“ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД по обособена позиция № 2** няма да бъде отваряно.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници да се извърши на 26.10.2018г. от 11:00 часа в заседателната зала, находяща се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Петрич.


Настоящият протокол се приключи и подписа без възражения и особени мнения от всички членове на 23.10.2018г.

Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликовете с офертите на участниците се оставиха на съхранение в сградата на Общинска администрация при Председателя на комисията.

КОМИСИЯ в състав:

Председател:

инж. Николай Иванов Попов :

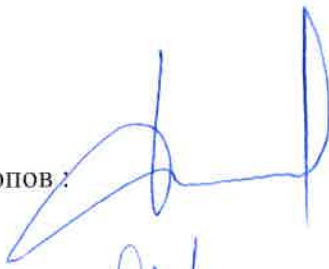

Членове:

1 . Антоанета Димитрова Кръстева :



2.инж.Галина Миланова Терзиева :

